



REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DA SAÚDE
DIRECÇÃO NACIONAL DE SAÚDE PÚBLICA
PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLO DA MALÁRIA

Distribuição de RTIs em Cabo Delgado - Adaptação para situações de ciclone e de conflito político armado

Uganda, 25 de Fevereiro de 2026

Conteúdo da apresentação

- Objectivo da Apresentação
- Situação da Malária a nível Global e Nacional
- Contextualização
- CCU após passagem do Ciclone Chido
- Cobertura da Campanha no Distrito de Mecúfi
- CCU nas áreas em conflitos político militar
- Cobertura da Campanha Zonas em Conflitos
- Principais Desafios
- Lições aprendidas



Objectivo da apresentação

Partilhar boas práticas e estratégias de implementação e monitoria da campanha de distribuição de redes mosquiteiras em situação de emergências após passagem do ciclone Chido e em zonas de conflitos político militar.




Situação da Malária a nível Global e Nacional

Mundo

- **282 milhões de casos e 610.000 mortes por malária em todo o Mundo, Moçambique (3,6%) (WHO, 2025)**

Casos de malária

- No ambulatório: 12.855.953 (SISMA)
- No internamento: 73.963 (SISMA);
- Óbitos intra-hospitalares: 496 (SISMA)

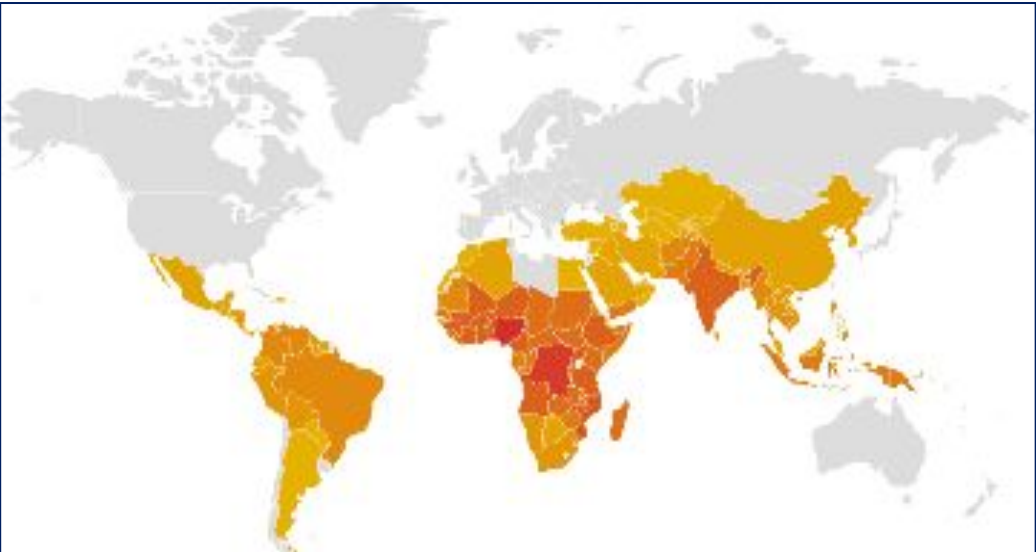

#	Indicadores – anuais	2024	2025	Evolução
1	Casos de malária	11.622.449	12.855.953	11%
2	Casos < 5 anos	4.855.015	5.243.008	8%
3	Mulheres grávidas que receberam 4 ou mais doses de TIP	1.438.238	1.489.431	4%
4	Mulheres grávidas que receberam Rede Mosquiteira (RTI)	1.898.109	1.744.805	-8%
5	Óbitos de malária	358	496	39%

Contextualização

- Campanha de Cobertura Universal (CCU) de RTIs, Ciclo 2025-2026 iniciou na província de Cabo Delgado, e teve um forte envolvimento na componente da mobilização Social.
- Engajamento político - dirigida por Sua Excia Governador da Província.

30 de Janeiro a 03 de Fevereiro de 2025

- **Mecufi (apos o cyclone Chido)**

24 a 28 de Março de 2025


- **Ancuabe, Balama, Chiúre, Metuge, Montepuez e Namuno**

08 a 12 de Abril de 2025

- **Ibo, Macomia, Meluco, Mocimboa da Praia, Mueda, Muidumbe, Nangade, Palma e Quissanga**

08 a 12 de Abril de 2025

- **Pemba**

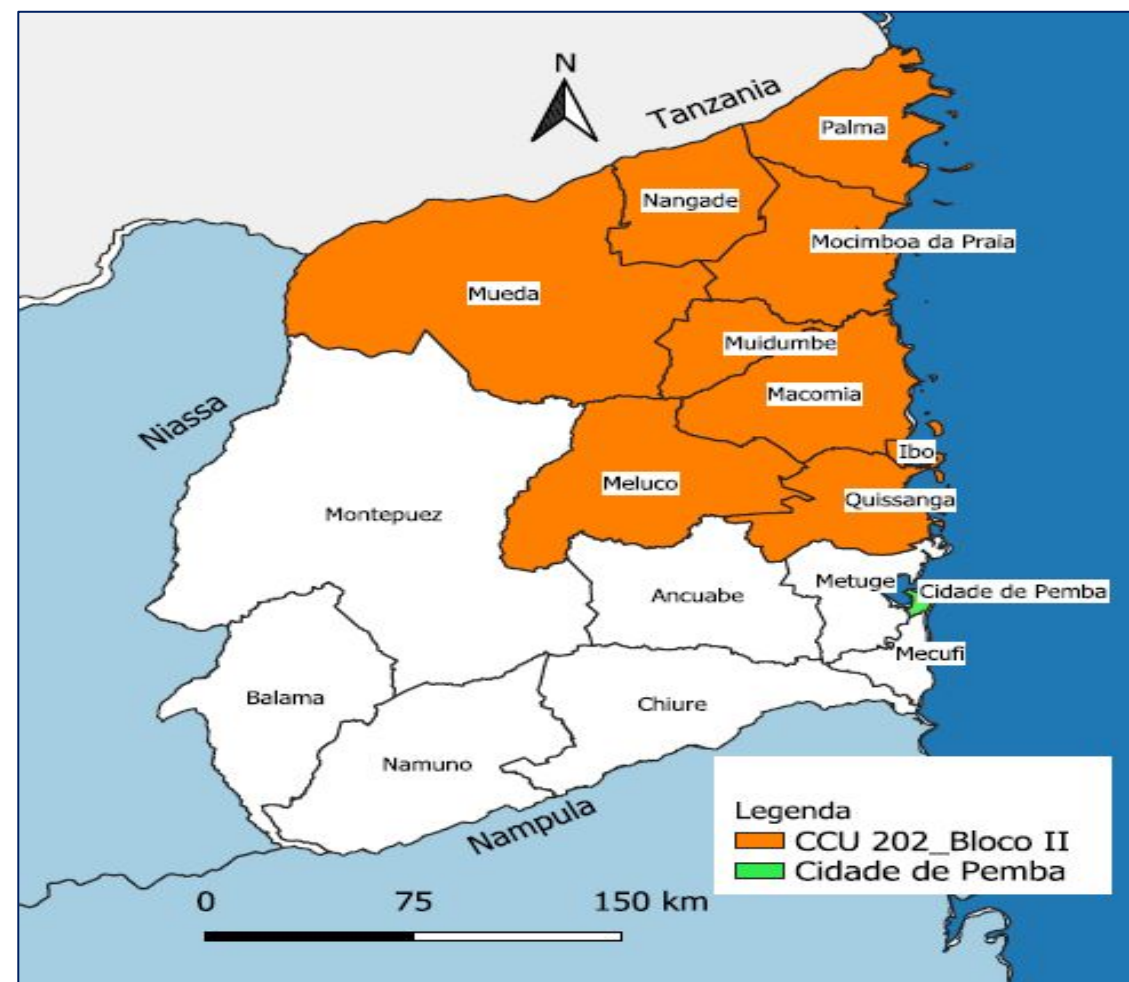

CCU após passagem do **Ciclone Chido**

- **Mecúfi** após a passagem do ciclone Chido que atingiu Moçambique a 15/12 de 2024 (com velocidade de ventos até 220 km/h),
- Foram **adaptadas e modificadas as 13 etapas PD**.

Estratégia PD

Na fase de registo eram 3 instrumentos-chave para o registo dos AF:

- Telemóvel
- Senha
- Autocolantes (Verdes e vermelhos)



Durante o registo de AF:

- Registo casa a casa e em forma de digitalização acompanhada de scan do QR code da senha;

Durante a distribuição:

- Em forma de PD, recebia-se a senha pelo receptor para confirmar com scan do QR code o nome do AF e depois passava para o distribuidor;
- O distribuidor fazia o scan da senha e depois fazia o scan da rede e dispensava a mesma para AF.



A digitalização da CCU foi baseada na plataforma Salama.




Dispositivos: Telefones Samsung A03 Core
Software gestor de dispositivos móveis: Scalefusion

- Imagens de áreas destruídas (acima)
- Após de recepção de RTI no PD (abaixo)

Adaptação pos **Ciclone**

N	Fases da CCU - Abordagem de emergência	Adaptações
1	Engajamento com as lideranças	Adaptada aos encontros regulares DPS/SPS e PNCM
2	ToT e Microplanificação Provincial	Virtual com a equipa de coordenação provincial apenas
3	Capacitação dos Jornalistas	Formação local, jornalistas sem formação
4	Advocacia com as lideranças distritais	Diálogos comunitários através comités de saúde
5	Formação de monitores locais para o registo dos AF	Realizada na sede do distrito em etapa única
6	Formação de registadores para mobilização e registo dos AF	Sem modificação
7	Registo dos AF	Redução de tempo de registo dos AF (de 7 para 4 dias)
8	Ajuste do microplano distrital (geral e logística)	Considerou-se a informação do registo de AF para a distribuição
9	Formação das equipas de distribuição	Redução de tempo de registo dos AF (de 2 para 1 dia)
10	Distribuição de RTI Logística Reversa e Gestão de resíduos sólidos	Manteve-se a estratégia de PD com a redução do tempo (de 7 para 5 dias)

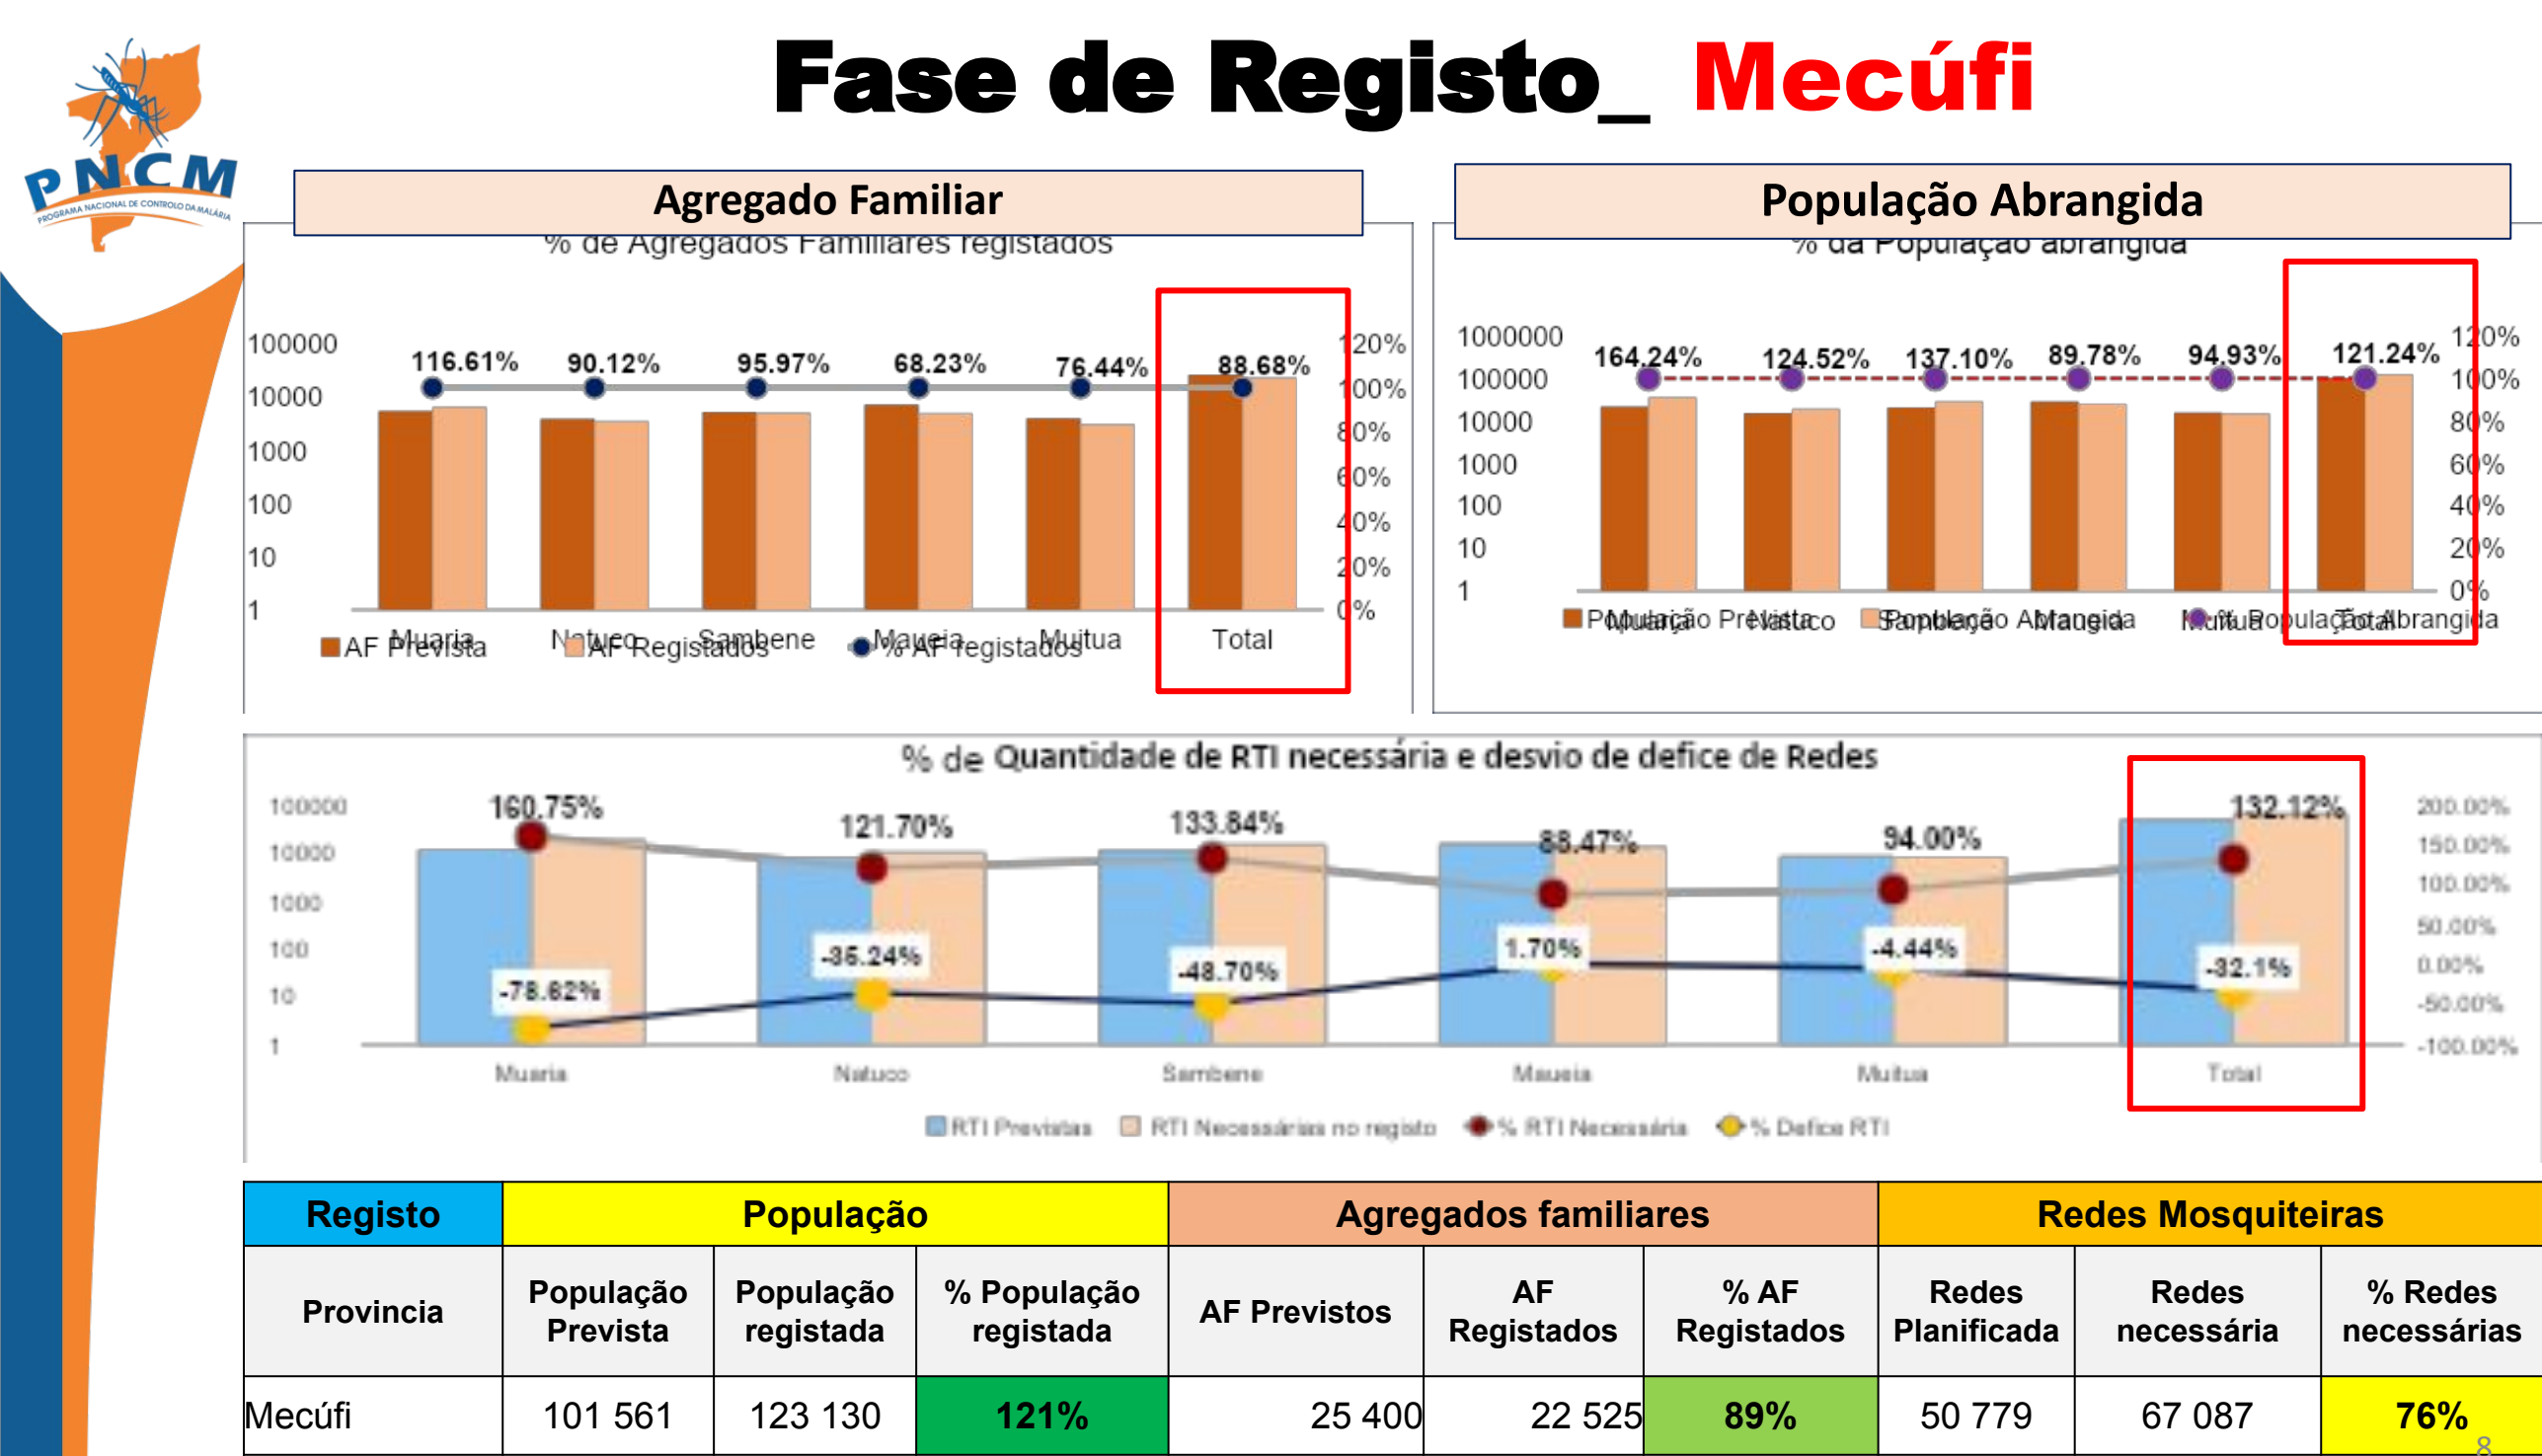

Registo	População			Agregados familiares			Redes Mosquiteiras		
Provincia	População Prevista	População registada	% População registada	AF Previstos	AF Registados	% AF Registados	Redes Planificada	Redes necessária	% Redes necessárias
Mecúfi	101 561	123 130	121%	25 400	22 525	89%	50 779	67 087	76%


8

Fonte: Salama

Fase de Distribuição_ Mecúfi


Agregado Familiar

% de AF abrangidos

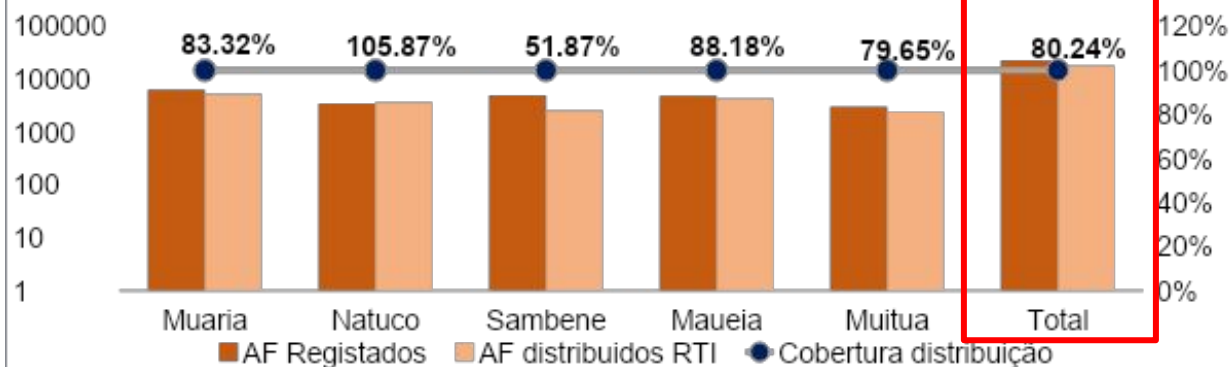


Poulação Abrangida

% da População abrangida

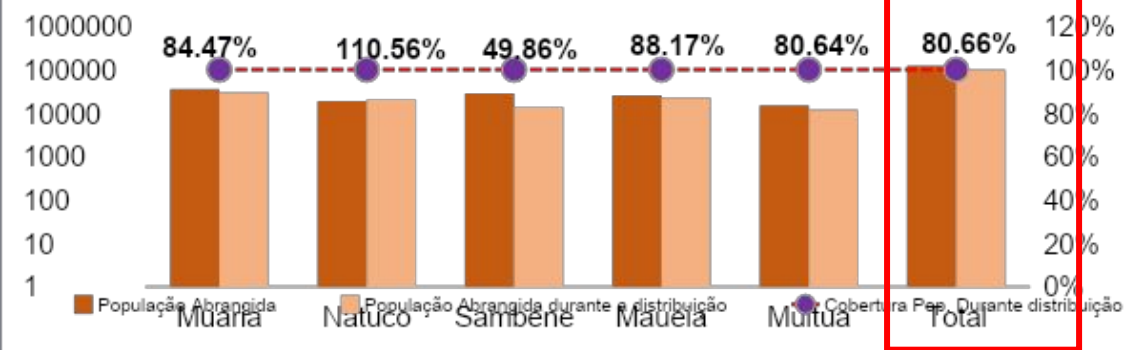

% de RTI distribuídas

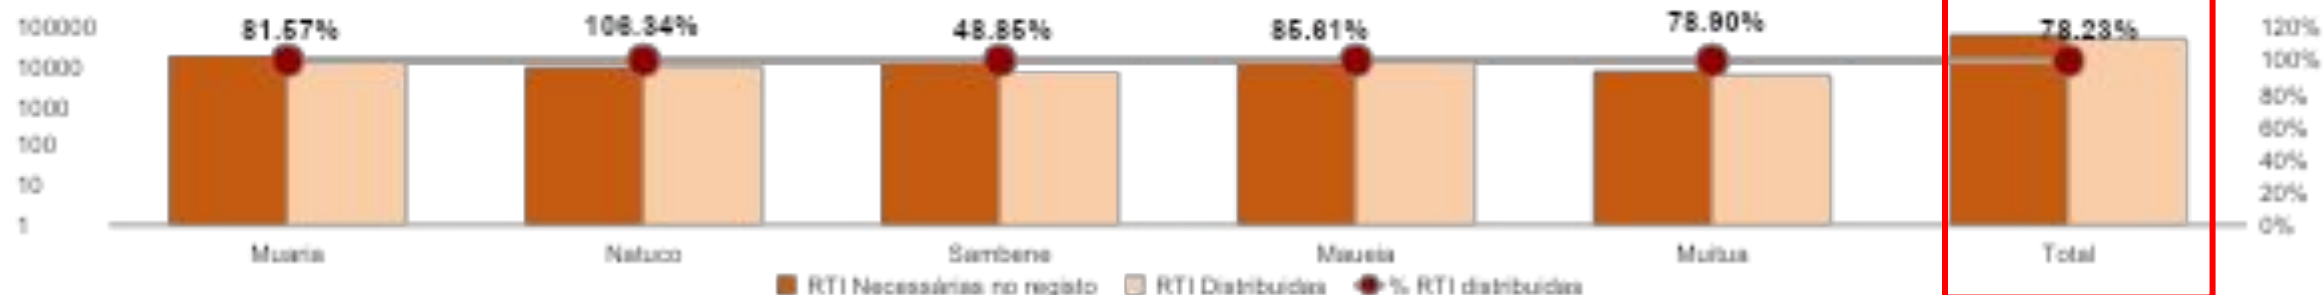

Distribuição	População			Agregados familiares			Redes Mosquiteiras		
Provincia	População Planificada	População alcançada	% População alcançada	AF Previstos	AF Beneficiados	% AF beneficiados	Redes Planificada	Redes Distribuídas	% Redes Distribuídas
Mecúfi	123 130	102 376	83%	22 525	18 638	83%	67 087	54 111	81%

CCU nas áreas em conflitos político militar

Distritos de Bloco II (Ibo, Macomia, Meluco, Mocímboa da Praia, Mueda, Muidumbe, Nangade, Palma e Quissanga): 08 a 12 de Abril de 2025.

Mista : Porta a Porta (PP) e Posto fixo adaptado (PD)	
Composição da equipa:	- Registador/mobilizador – Membro Permanente - Distribuidor e Guia – Equipa apoio, membros da comunidade
Instrumentos-chave	- Telemóvel - Autocolante (Verde)



A distribuição das RTI foi executada com apoio de segurança nacional.

Parceria das Forças Armadas de Defesa de Moçambique (FADM), das Forças Amigas do Ruanda e da Polícia da República de Moçambique (PRM).

Articulação multisectorial, o Governo Distrital e lideranças locais, garantiu a integridade das equipas e do material através de escoltas militares.

A digitalização da CCU foi baseada na plataforma Salama.



Dispositivos: Telefones Samsung A03 Core
Software gestor de dispositivos móveis: Scalefusion




Adaptação das fases_ **Zonas em conflitos**

N	Fases da CCU	Adaptações
1	Reunião de engajamento com as lideranças provinciais e distritais	Sem adaptação
2	ToT e Microplanificação Provincial	Sem modificação
3	ToT provincial para implementação Capacitação dos Jornalistas	Sem adaptação
4	Advocacia com as lideranças distritais Mobilização distrital para o registo e distribuição	Sem adaptação
5	Formação de Monitores locais para o registo dos agregados familiares e distribuição das RTI Formação dos fiéis de armazém Comunitários	Sem adaptação
6	Mobilização para o Registo e distribuição dos Agregados Familiares:	Exclusivamente feita pela liderança local e sem formação, apenas partilha de mensagens-chave
7	Formação de registadores para para mobilização, registo e distribuição Pré-posicionamento das RTI	Realizada na sede do distrito. Para o efeito de pré-posicionamento foram usadas camionetas como armazéns móveis em áreas menos seguras e em escolas ou US onde oferecesse mais segurança.
8	Registo e distribuição das RTI Logística Reversa e Gestão de resíduos sólidos	Estratégia mista, áreas segura implementada estratégia porta a porta e áreas inseguras implementada posto fixo adaptado sem uso de senhas Recolha das equipas no campo mais cedo
9	Sem adaptação	Sem adaptação
10	Balanço distrital	Sem adaptação
11	Mobilização pós-distribuição	Sem adaptação

Registo e Distribuição_Zona de Conflitos


Agregado Familiar

% de Agregados distribuídos RTI

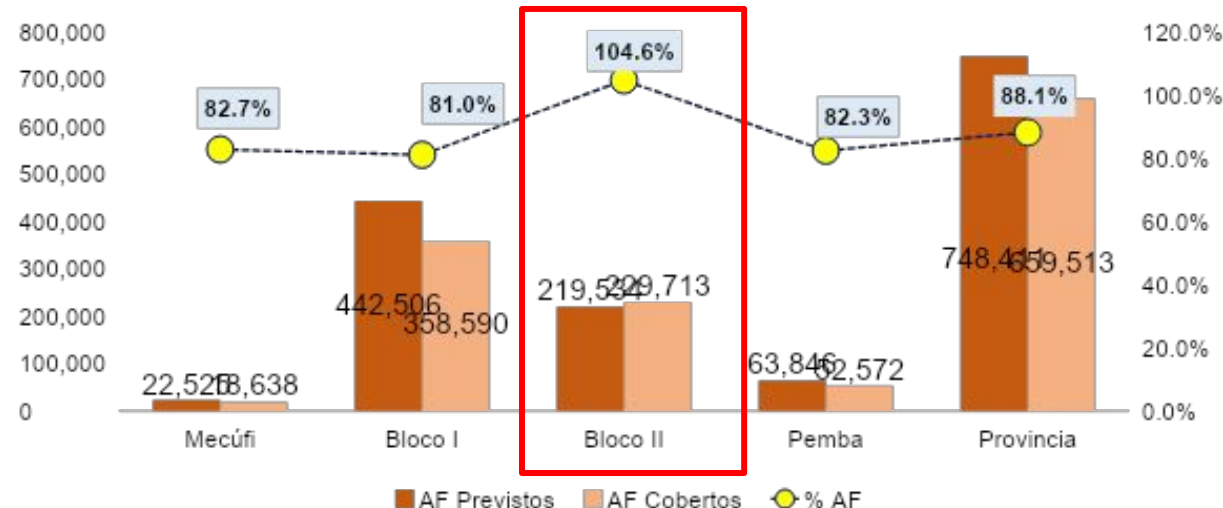


População Abrangida

% da População abrangida durante a distribuição

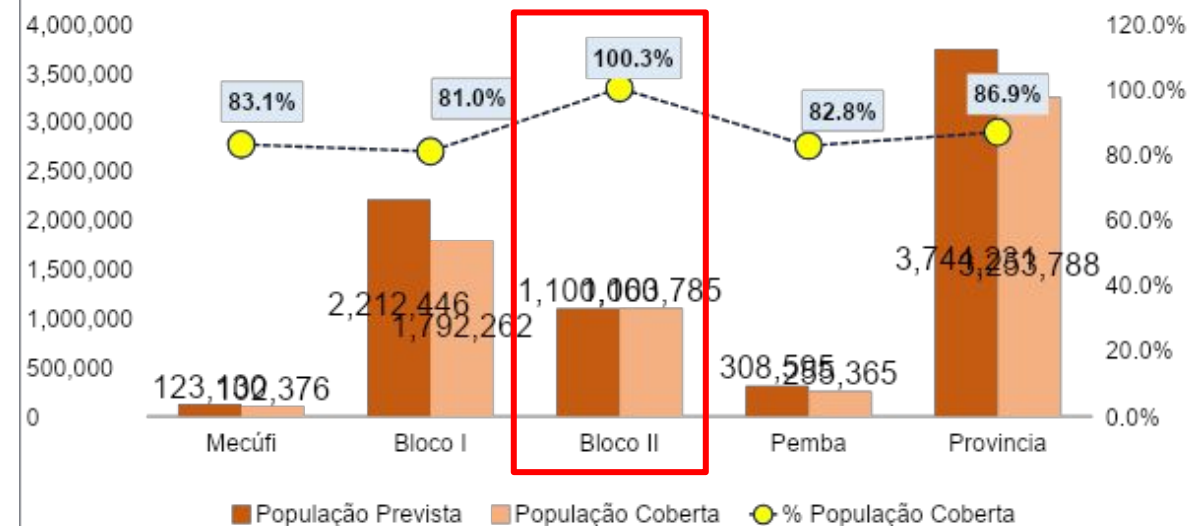

Cobertura de RTI distribuídas

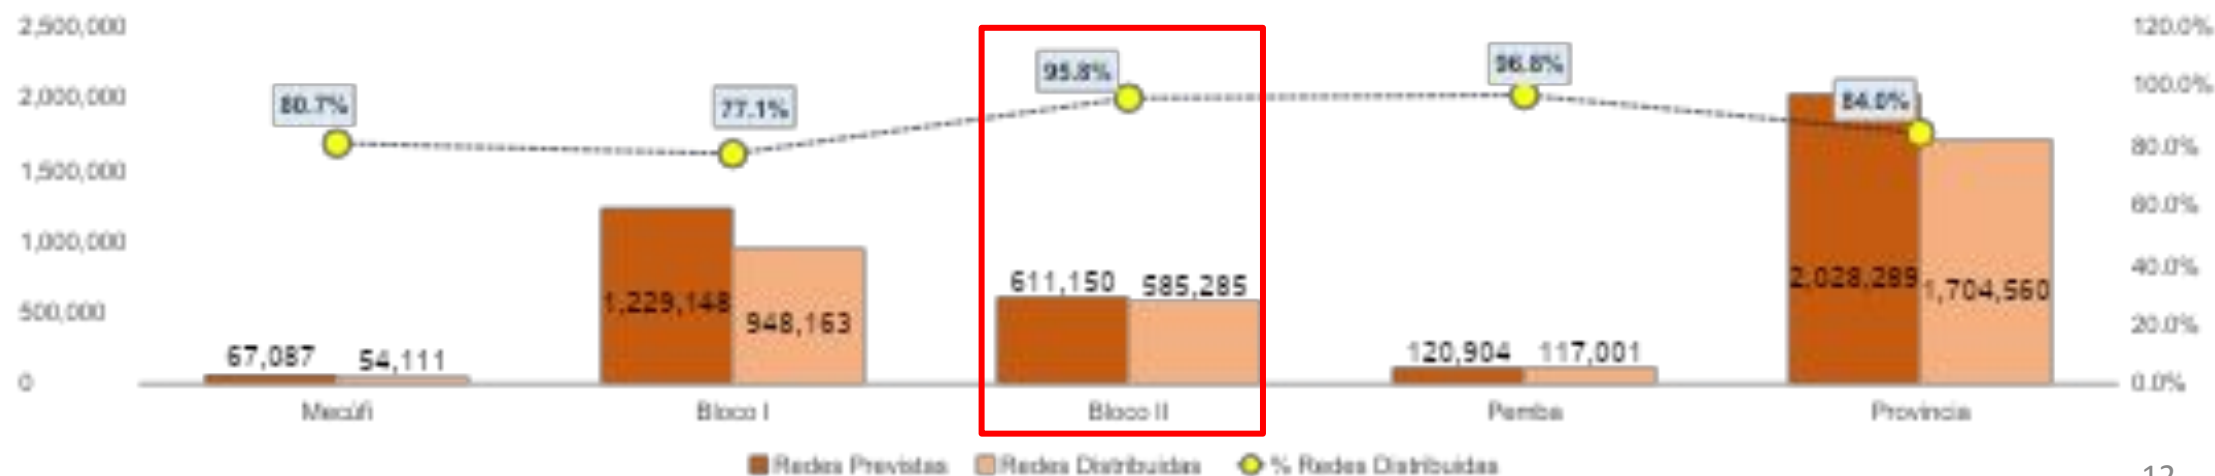

Cobertura nas **Zonas em Conflitos**

Registo e Distribuição		População			Agregados familiares			Redes Mosquiteiras		
Blocos	Distritos	População Prevista	População alcançada	% População alcançada	AF Previstos	AF Beneficiados	% AF beneficiados	Redes Previstas	Redes Distribuídas	% Redes Distribuídas
Bloco II	Ibo	29 909	30 876	103%	5 981	7 913	132%	16617	12562	76%
	Macomia	151 162	163 917	108%	30 235	32 253	107%	83978	87204	104%
	Meluco	46 187	48 857	106%	8 755	9 986	114%	25657	26723	104%
	Moc. Praia	171 821	183 189	107%	34 366	34 127	99%	95459	96017	101%
	Mueda	274 759	248 754	91%	54 955	51 659	94%	152646	132267	87%
	Muidumbe	119 109	111 749	94%	23 823	22 445	94%	66172	59911	91%
	Nangade	113 675	118 412	104%	22 735	27 893	123%	63158	64379	102%
	Palma	130 334	123 909	95%	26 063	28 285	109%	72405	66769	92%
	Quissanga	63 104	74 122	117%	12 621	15 152	120%	35058	39453	113%
Total		1 100 060	1 103 785	100%	219 534	229 713	105%	611 150	585 285	96%

Principais Desafios

Zona com Ciclone

Coordenação

- Remoção e/ou encurtamento em algumas fases
- Vias de acesso intransitáveis por causa das chuvas
- Passagem de mensagens chave deficiente
- Estimação de recursos
- Deficiente pagamentos dos actores comunitários
- Distribuição anteriores de alimentos não abrangente
- Falta de recursos adicionais (finanças e RTI)
- Incertezas na garantia de uso da RTI
- Falta de armazéns intermediários para RTI

M&A e digitalização

Zonas de Conflitos

Coordenação

- No acesso aos locais inseguros
- Disponibilidade de viaturas para locais inseguros
- Logística para escoltar militares
- Incertezas na garantia de uso da RTI
- Falta de armazéns intermediários para RTI

M&A e digitalização

- Disponibilidade de rede móvel e de electricidade
- Dificuldade na sincronização de dados e monitoria da campanha durante a implementação
- Registadores sem o perfil necessário (habilidades de manejo de dispositivos para registo)
- Definição de denominadores para indicadores

Lições aprendidas

Zona com Ciclone

- Planificar a presença das forças de segurança para garantir distribuição ordeira nas zonas afetadas por desastres
- Elaborar protocolo específico para responder casos de emergência complexas
- Adaptação e flexibilidade para o ajuste a situações de emergências
- Necessidade de um instrumento orientador para implementação de campanha em locais de emergência

Zonas de Conflitos

- O envolvimento e engajamento da liderança a todas fases da campanha
- Planificar a presença das forças de segurança para garantir distribuição ordeira nas zonas de conflito político militar
- Necessidade de um instrumento orientador para implementação de campanha em locais conflitos político militar

Recomendações

- Elaboração de manual de implementação de campanhas em contexto de ciclone e de conflito político militar
- Plano de resposta a emergência para redução de tempo de resposta
- Reforçar o engajamento para maior apoio do governo na movimentação para zonas de ciclone e conflitos político militar
- Envolver activamente as equipas de FDS nas fases de formação, registo e distribuição de RTI nas zonas de ciclone e conflito político militar





Agradecimentos para:



OBRIGADO!

SE VOCÊ QUER MUDAR O MUNDO, PRIMEIRO
TENTE MELHORAR E MUDAR A SI MESMO.

Dalai Lama

